

Relatório de Andamento do Projeto

GlicNutri — ADS5 Projeto de Sistemas · Entrega gestão 01/06/2026

Equipe: 5 integrantes | **Período de desenvolvimento:** fev–jun/2026 (cronograma oficial ADS5)

Esforço estimado (grupo): ~520–640 h | **Stack:** Expo · Supabase · Python/FastAPI · ML

Apresentação: Studeo ADS5A — 01/06/2026 (10 min)

Gráficos de gestão neste documento:

- Cronograma ADS5 e marcos de entrega
- Atividades concluídas e pendentes
- Divisão de esforço da equipe (visão geral)
- Progresso do projeto
- Riscos e problemas
- Tempo gasto e etapas do desenvolvimento
- Resumo de telas (paciente, nutri, médico espelhado)

1. Resumo executivo

91%

Progresso geral

15/17

Marcos ADS5 até 25/05


51

Telas mapeadas

Situação: sistema funcional (paciente, nutricionista, médico, admin), BD, auditoria/LGPD, ML e LibreLinkUp concluídos. Pendência principal: artefatos de fechamento (ZIP, vídeo, slides) e esta entrega de gestão (01/06).

2. Cronograma ADS5


Desenvolvimento alinhado ao *Cronograma ADS5 — Projeto de Sistemas 2026*. Verde = entregue; laranja = em curso.

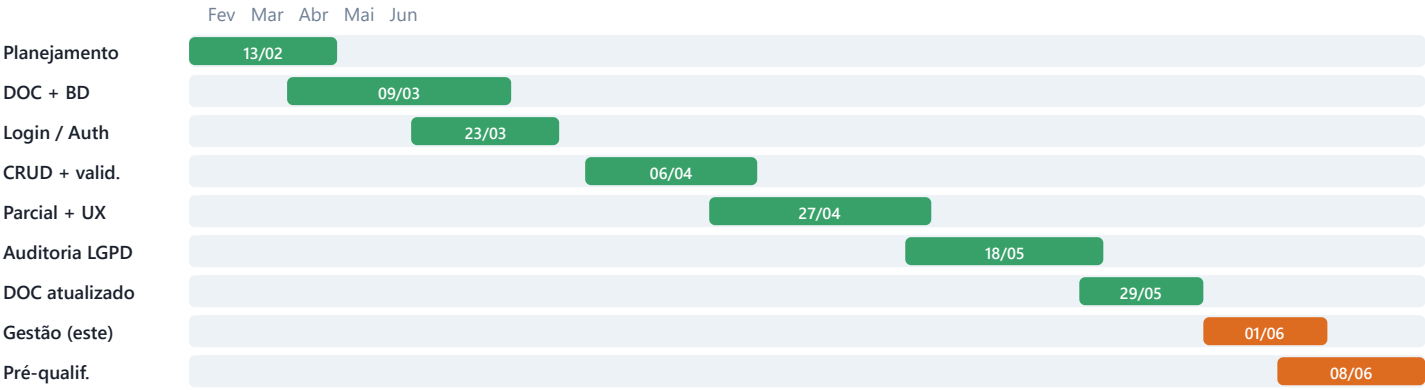


Data início	Marco ADS5	Entrega	Status
09/02	Cronograma do projeto	13/02	OK
23/02	DOC Word (tecnologias e requisitos)	27/02	OK
09/03	Banco de dados e tabelas	09/03 ADS5A	OK
23/03	Login + esqueci senha	23/03 ADS5A	OK
06/04	CRUD com validações (CPF, CEP...)	06/04 ADS5A	OK
13/04	Avaliação parcial (etapas até aqui)	13/04 ADS5A	OK
27/04	Movimentação, validação e usabilidade	27/04 ADS5A	OK
04/05	Organização + auditoria de código	04/05 ADS5A	OK
18/05	Logs de auditoria + LGPD	18/05 ADS5A	OK
25/05	DOC Word atualizado	29/05	OK
01/06	Relatório de gestão + gráficos	01/06 ADS5A	Este doc
08/06	Sistema funcional (pré-qualificação)	08/06 ADS5A	Próximo
22/06	ZIP + slides + vídeo 5 min	22/06 ADS5A	Aberto

3. Progresso do projeto


Progresso geral



Por área



Etapas do desenvolvimento



4. Atividades concluídas e pendentes

Gráfico resumo




Marcos técnicos principais



Status	Atividade
OK	App completo: paciente (23 telas), nutri (7), admin (7), auth (4)
OK	Nutri: agenda, pacientes, chat com paciente, relatórios PDF, prontuário, consulta
OK	ML (/predict), LibreLinkUp, auditoria, LGPD, migrations Supabase
OK	Médico: 7 telas espelhadas (diabetes/exames; alimentação fica no nutri)
Aberto	ZIP final, vídeo 5 min, upload Studeo pré-qualificação (08/06)

5. Divisão de esforço — equipe (5 integrantes)


Visão geral do grupo (sem nomes individuais). Distribuição equilibrada conforme competências.



Área	Principais entregas	Período
Frontend	Telas paciente/nutri/médico, UX, chat, agendamentos	mar–mai
Backend	Supabase, RPC, Edge Functions, Libre sync	mar–mai
ML	CSV, notebook, 4 modelos, FastAPI /predict	abr–mai
Documentação	DOC Word, resumo expandido, evidências Bento	fev–jun
Gestão/QA	Cronograma, testes, pacote ZIP, apresentações	fev–jun

6. Tempo gasto e etapas

Esforço total estimado: ~520–640 h (5 integrantes × ~18 sem × 6–7 h/semana).



Fase	Período ADSS5	Entregável
1. Planejamento	Fev/26	Cronograma + DOC inicial
2. Fundação	Mar/26	BD, login, cadastro
3. Desenvolvimento	Abr/26	CRUD, telas, parcial
4. Integração	Mai/26	Auditoria, ML, Libre, LGPD
5. Encerramento	Jun/26	Gestão, pré-qualif., ZIP final

7. Riscos e problemas

	Baixa	Média	Alta
Alto	—	Prazo jun	ZIP/vídeo
Médio	ML ✓ Libre ✓	Médico espelho	—
Baixo	API ✓	—	—

Risco	Mitigação	Status
Atraso pacote final (ZIP, vídeo)	Scripts prontos; deadline 22/06	Aberto
Médico sem paridade total com nutri	7 telas implementadas; escopo clínico distinto	Mitigado
LibreLinkUp / ML	Sync LA + API local testada	Mitigado

8. Telas do sistema (resumo)

Paciente — abas principais (5 telas)

#	Tela	Função	Status
1	Início	Dashboard, resumo glicêmico e atalhos	OK
2	Alimentação	Diário alimentar e registro de refeições	OK
3	Glicose	Glicemia manual, insulina e medicação	OK
4	Agendamentos	Busca de nutricionista e marcação de consultas	OK
5	Plano	Plano alimentar prescrito	OK

Paciente — telas complementares (18 telas)

#	Tela	Função	Status
6	Onboarding	Primeiro acesso e configuração inicial	OK
7	Registrar Refeição (IA)	Foto + estimativa nutricional por IA	OK
8	Histórico de Registros	Glicose, refeições, insulina e meds	OK
9	Previsão (IA) / ML	Previsão glicêmica via /predict	OK
10	Integração do sensor (Libre)	LibreLinkUp, sync CGM	OK
11	Progresso	Metas e evolução clínica	OK
12	Bem-estar	Humor, sono e bem-estar	OK
13	Assistente	Assistente virtual orientativo	OK
14	Suporte	FAQ e ajuda	OK
15	Mensagens	Lista de chats com nutricionista	OK
16	Conversa (chat)	Chat em tempo real com profissional	OK
17	Perfil do nutricionista	Dados do profissional antes do agendamento	OK
18	Perfil	Visão geral da conta	OK
19	Identificação e contato	Dados pessoais	OK
20	Saúde, metas e rotina	Metas glicêmicas e rotina	OK
21	Insulinas em uso	Esquemas de insulina	OK
22	Notificações	Preferências de alertas	OK
23	Privacidade e segurança	LGPD, senha e consentimentos	OK

Nutricionista (7 telas — referência)

#	Tela	Função	Status
1	Início	Dashboard e alertas	OK
2	Agenda	Consultas presencial/video	OK
3	Pacientes	Carteira clínica	OK
4	Mensagens (chat)	Chat em tempo real com paciente	OK
5	Relatórios	PDF e indicadores	OK
6	Prontuário	Plano e evolução	OK
7	Consulta	Sessão com anotações	OK

Médico — espelho do nutricionista (7 telas)

#	Tela médico	Foco clínico	Status
1	Início	Dashboard diabetes/exames	OK

#	Tela médico	Foco clínico	Status
2	Agenda	Consultas clínicas	OK
3	Pacientes	Carteira vinculada	OK
4	Mensagens (chat)	Orientações clínicas via evolução	OK
5	Relatórios	Glicose, risco, CSV clínico	OK
6	Prontuário	Diabetes, meds, insulina, exames	OK
7	Consulta	Sessão + conduta clínica	OK

Nutri mantém foco alimentar/plano; médico foco glicemia, medicação e exames.

9. Conclusão

O GlicNutri cumpre os marcos ADS5 até auditoria/LGPD (18/05). Este relatório atende a entrega de **01/06**. Próximos passos: completar paridade médico↔nutri, pré-qualificação (08/06) e pacote final (22/06).

GlicNutri ADS5 · 31/05/2026 · Regenerar: `python scripts/doc-export/gestao_projeto_to_pdf.py`
